



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL NO.
MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

Convenio adicional que celebran por una parte el Municipio de Colón Querétaro, a quien se denominará "EL CONTRATANTE", representado por el Arq. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui en su carácter de Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro.; por la otra la empresa CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V. representada en este acto por ING. JUAN MARTÍN MALAGÓN CORREA, a quien se denominara "EL CONTRATISTA", y a ambos se les denominará "LAS PARTES", de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

PRIMERA: "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

1. Con fecha **21 de junio de 2023** "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" celebran el contrato de la obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO. NÚMERO MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419**, por la cantidad de **\$2'241,771.58** (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.), I.V.A incluido.

SEGUNDA: "EL CONTRATANTE" DECLARA QUE:

- A. El periodo para la ejecución de los trabajos en contrato se estipuló fuera del **05 de julio de 2023** al **01 de noviembre de 2023** para el término de los trabajos y con fecha de término de contrato al **16 de noviembre de 2023**. Los trabajos físicamente fueron iniciados conforme a la fecha indicada en el contrato.
- B. La contratista ingresó documentación para el trámite de pago de anticipo en tiempo y forma conforme a lo especificado en las cláusulas de contrato y recibió el monto correspondiente en fecha 17 de julio de 2023.
- C. Derivado del dictamen, realizado y aprobado por la Dirección de Obras Públicas, de fecha 25 de octubre de 2023 se ha determinado la necesidad de ampliar el plazo de término de los trabajos del 01 de noviembre de 2023 al 29 de noviembre de 2023, y el término de contrato con fecha al 14 de diciembre de 2023, por lo que requiere la ampliación del plazo a fin de estar en condiciones de comprobar el gasto de manera correcta, por lo que en común acuerdo entre a "LAS PARTES", se autoriza el plazo para el término de contrato al 14 de diciembre de 2023. Dicho dictamen forma parte del presente convenio (anexo único).

TERCERA: "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- A. Conoce el alcance las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

FUNDAMENTO LEGAL

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ARTÍCULO 56 - En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22)

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



Página 1 de 3

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL NO.
MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

El monto y el plazo de ejecución de la ampliación al contrato original, deberán formalizarse a través del convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Si derivado de circunstancias ajenas a las partes, resulta necesaria la actualización en el programa calendarizado de ejecución, tal situación deberá hacerse constar en un convenio modificatorio debidamente justificado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término pactada. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Tratándose de modificaciones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo original, e incremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requiera, debiendo integrarse las constancias o validaciones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se trate. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

En la ampliación y modificación de las condiciones originales contractuales, se deberá observar en todo momento, que no existan características que alteren el proyecto y condiciones de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Los precios contemplados en la modificación o ampliación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original. (Ref. P. O. No. 37, 20-V-22).

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es la ampliación al plazo de ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.**

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" Manifiesta su conformidad para que el plazo para finiquitar administrativamente la obra mencionada en la cláusula primera del presente convenio, sea hasta el día 14 de diciembre de 2023.

TERCERA. "LAS PARTES" Convienen en que por excepción de lo señalado y que se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente convenio, lo firman por triplicado de conformidad en el Municipio de Colón Querétaro el día 26 de octubre de 2023.





Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO ADICIONAL NO.
MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419-CM.01
AL CONTRATO MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

POR "LA CONTRATANTE"

POR "LA CONTRATISTA"


ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI
SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE COLÓN


CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.
ING. JUAN MARTÍN MALAGÓN CORREA
CONTRATISTA


ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

Dictamen técnico que funda, motiva y justifica **modificar el plazo** para la ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.** En la localidad de **EL BLANCO, COLÓN, QRO.** Inserta dentro del Programa de Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2023 y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

- a) Con fecha 02 de Junio de 2023 el Encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas municipales emite oficio 2023GEQ00586 para la suficiencia presupuestal de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.** En la localidad de el Blanco, Colón, Qro. con un total aprobado de \$ 2, 300,000 00 pesos M.N.
- b) Con fecha 09 de Junio de 2023 se emiten los oficios de invitación directa para la adjudicación de la obra de **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.** En la localidad de el Blanco, Colón, Qro.
- c) Con fecha 06 de junio de 2023 se visita el sitio de los trabajos por parte de las empresas contratistas invitadas e igualmente ese día se realiza la junta de aclaraciones.
- d) Con fecha 16 de junio de 2023 se reciben las propuestas técnicas y económicas por parte de los postores y se procede a la revisión de propuestas.
- e) Con fecha 20 de junio de 2023 se emite el fallo del contratista para la ejecución de la obra en comento.
- f) Con fecha 21 de junio de 2023 se firma contrato de obra No. **MCQ.SOP FISE AD.011 09/2023-00419** entre el Municipio de Colón Querétaro y la contratista "**CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V.**" representada en ese acto por el Ing Manuel Alejandro Malagón Mata en su carácter de apoderado legal, con periodo de ejecución de los trabajos del 05 de julio al 01 de Noviembre de 2023 y fecha de término de contrato al 16 de noviembre de 2023 y un monto de \$ 1,932,561.71 más \$ 309,209.87 del I.V.A. siendo un total contratado de \$ 2,241,771.58 (Dos millones doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y un pesos 58/100) M.N.
- g) Se tramita el anticipo del 30% con un monto de \$ 672,531.47 incluido el I.V.A.
- h) Se inician los trabajos conforme a la fecha de contratación.

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

- 1) Que conforme avanza la obra, se tiene la necesidad imperiosa de realizar un ampliación de metas, por lo tanto contratista ingresa oficio S/N con fecha 25 de octubre del 2023 (Oficio emitido, con documentación adjunta); donde solicita un ampliación de 28 días naturales por ampliación de metas, los trabajos ampliar son:

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA **AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.** en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

- a) Trabajos de preliminares
- b) Trabajos de excavaciones, cargas y acarreos
- c) Rellenos
- d) Tubería y descargas
- e) Pozos de visita y registros
- f) Reparación
- g) Limpieza
- h) Conceptos atípicos

CONCLUSIONES

Único: Elaborar el **contrato modificatorio al plazo** de la obra **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.** En la localidad de **El Blanco, Colón, Qro.** Contratada originalmente por \$ 2, 241,771.58 recorriendo la fecha de terminación de los trabajos del 01 de Noviembre de 2023 al 29 de noviembre de 2023, y la terminación administrativa del 16 de noviembre al 14 de diciembre de 2023, requiriendo a la contratista ajustarse a las condiciones contenidas en el fundamento legal y el clausulado de contrato original, mismas que aplican en todas y cada una de sus características.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

ARTÍCULO 5.- Estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, toda obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier actividad relacionada con la obra pública que aquellas contraten y se realicen con cargo total o parcial a:

I.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con la participación que en su caso corresponda a los Municipios.

II.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal, con la participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los particulares por sí mismos

III - Los fondos municipales

ARTÍCULO 56 - En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original.

El monto y el plazo de ejecución de la ampliación al contrato original, deberán formalizarse a través del convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra.

Si derivado de circunstancias ajenas a las partes, resulta necesaria la actualización en el programa

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO, en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

calendarizado de ejecución, tal situación deberá hacerse constar en un convenio modificatorio debidamente justificado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término pactada.

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas.

Tratándose de modificaciones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo original, e incremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requiera, debiendo integrarse las constancias o validaciones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se trate.

En la ampliación y modificación de las condiciones originales contractuales, se deberá observar en todo momento, que no existan características que alteren el proyecto y condiciones de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma.

Los precios contemplados en la modificación o implicación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad.

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original.

ARTÍCULO 57.- Una vez adjudicada la obra, suscritos los documentos requeridos y recibido el anticipo correspondiente, la contratante dará posesión al contratista del sitio destinado a la obra y aquel deberá dar inicio a los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; el contratista podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la recepción del anticipo.

LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33

PRIMERO - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

SEGUNDO - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO, en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx

(419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO


TERCERO.- Además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Aportaciones Federales: los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y, en su caso, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

Calendario para el registro de avances en el SFU				
Reporte de avances	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mes en que se reporta	abril	julio	octubre	enero
Captura de información.	1 al 15	1 al 15	1 al 15	1 al 15
Revisión de información de municipios o Demarcaciones y emisión de observaciones por parte de la entidad federativa correspondiente.	18	18	18	18
Atención a observaciones por parte de los municipios o Demarcaciones, para envío de información consolidada.	20	20	20	20
Revisión de información y emisión de observaciones por parte de las Dependencias y Entidades	23	23	23	23
Atención a observaciones por parte de las entidades federativas.	25	25	25	25
Cierre definitivo del SFU.	25	25	25	25

El presente **Dictamen** se elabora en el Municipio de Colón Querétaro, a los 25 días del mes de octubre de 2023, firmando al calce las personas que en esta intervinieron.

Por El Municipio

Nombre	Cargo	Firma
ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.



CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ING. CIRILO RAMIREZ CABRERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	
ARQ. LUIS ENRIQUE JIMENEZ ALMARAZ	SUPERVISOR DE OBRA	

Por El Contratista

Nombre	Cargo	Firma
ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGÓN MATA	CONTRATISTA	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. en la localidad de LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO

Santiago de Querétaro, Qro., 25 de octubre de 2023

Asunto: **Ampliación del tiempo contractual.**

**ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE COLON**

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, me refiero al contrato **MCQ.SOP.FISE.AD.011.09/2023-00419** de la obra: **REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.**, por motivo de los trabajos solicitados y realizados fuera del alcance inicial del contrato y ampliación de metas, solicito amablemente una ampliación de tiempo contractual de acuerdo al calendario anexo a este, por un periodo de 28 días naturales adicionales.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención, me despido de usted.

Atentamente



**ING. MANUEL ALEJANDRO MALAGON MATA
APODERADO LEGAL**

C.c.p. Archivo



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 1

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.							
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.							
PREELIMINARES							
30	1010002	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.80 X 3.60 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL. 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 5.10 M MÁS 0.90 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.90 M DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, CUATRO TRAVESAÑOS DE 1.80 M Y LÁMINA NEGRA CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	1.00	05/Jul/2023	2c	06/Jul/2023
40	1021003	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	642.13	05/Jul/2023	73c	15/Sep/2023
50	1050002	RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL 50% DE LA PIEDRA. INCLUYE: SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL RECUPERADO, APILE, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE LA PIEDRA. PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN AL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	525.13	05/Jul/2023	48c	21/Ago/2023
60	1050005	RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, CON RECUPERACIÓN DEL 80% DE LA PIEDRA. INCLUYE: SELECCIÓN DE MATERIAL RECUPERADO, LIMPIEZA DE PIEDRA, APILE, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE LA PIEDRA. PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN AL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	117.00	10/Jul/2023	36c	14/Ago/2023
70	1040164	DEMOLICIÓN A MANO DE POZO DE VISITA COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL Y TAPA. INCLUYE: EXTRACCIÓN, TRASPALEO Y APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	9.00	12/Jul/2023	43c	23/Ago/2023



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 2

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
80	1060552	RETIRO DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16 5 DE 12" (305 MM), CON RECUPERACIÓN INCLUYE: MANIOBRAS DE IZAJE PARA RETIRAR DE ZANJA, ACARREOS LOCALES, ESTIBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	m	117.00	12/Jul/2023	43c	23/Ago/2023
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS							
100	02020122	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	517.24	09/Jul/2023	58c	04/Sep/2023
110	02020123	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	m3	453.53	13/Jul/2023	68c	18/Sep/2023
120	02020022	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALCO HASTA 4.00 M HORIZONTAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	57.50	09/Jul/2023	58c	04/Sep/2023
130	02020023	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, TRASPALCO A 4.00 M HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3	49.36	13/Jul/2023	68c	18/Sep/2023
140	02030017	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	1,120.59	09/Jul/2023	72c	18/Sep/2023
150	02030082	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m3-km	5,042.36	09/Jul/2023	72c	18/Sep/2023
RELLENOS							
170	3010002	CAMA DE ARENA DE MINA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, VACIADO, AFINE Y NIVELADO DE LA CAPA, MANO DE OBRA,	m3	70.45	17/Jul/2023	73c	27/Sep/2023



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 3

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP FISE AD 011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.					
180	3020052	ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	366.28	23/Jul/2023	78c	08/Oct/2023
190	3030052	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P. V. S. M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	526.84	26/Jul/2023	78c	11/Oct/2023
		TUBERÍA					
210	4010001	CINTA PLÁSTICA GRIS PARA ADVERTENCIA DE TUBERÍA EN ZANJA, CON LA LEYENDA "CEA-LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL BAJO EL NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	738.13	26/Jul/2023	73c	06/Oct/2023
220	4010023	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16.5 DE 12" (305 MM). INCLUYE: CAMPANA Y ANILLO RIEBER, SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	594.13	19/Jul/2023	73c	29/Sep/2023
230	4010053	INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 16.5 DE 12" (305 MM). INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN, TENDIDO, EQUIPO, MANIOBRAS, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m	48.00	30/Jul/2023	48c	15/Sep/2023
240	4010403	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO, CODO PVC SERIE 16.5 INYECTADO 45°X6", T EN YEE DE PVC SERIE 16.5 INYECTADO 12°X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	23.00	19/Jul/2023	76c	02/Oct/2023

POZOS DE VISITA Y REGISTROS



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 4

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO
CONCURSO No. SOP.FISE AD 011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
260	4030006	REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 40X60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO A BASE DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBO SENTIDOS EN UN SOLO LECHO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDODE 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE TABIQUE ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y LOSA TAPA DE 68X88 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN SÓLO LECHO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	16.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023
270	4040001	POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	7.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023
280	4040002	POZO DE VISITA COMÚN DE 1.26 M A 1.50 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, MATERIALES, DOS ANILLOS DE HULE, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	2.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023
290	4040004	POZO DE VISITA COMÚN DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES)	pza	1.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 5

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.					
300	4040061	POZO DE VISITA CON CAÍDA ADOSADA DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, CON CAÍDA HASTA 0.50 M DE ALTURA. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, CODO 12"x 90° DE PVC, TUBO DE PVC SERIE 16.5 DE 12" DE DIÁMETRO Y 0.50 M DE LONGITUD, TAPA DE CONCRETO F'C= 100 kg/cm2 DE 7 CM DE ESPESOR, ACABADO APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	1.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023
310	4040006	POZO DE VISITA COMÚN DE 2.26 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD Y DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN 10X14X28 (NOMINALES) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ESCALÓN DE POLIPROPILENO @40 CM, DOS ANILLOS DE HULE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	pza	1.00	21/Jul/2023	78c	06/Oct/2023
320	4040303	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN.	jgo	12.00	30/Ago/2023	41c	09/Oct/2023
330	4040401	CONEXIÓN DE RED ALCANTARILLADO A POZO DE VISITA EXISTENTE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE DEMOLICIÓN, RESANES CON MORTERO SEGÚN CONDICIONES DE LA OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pza	2.00	08/Sep/2023	32c	09/Oct/2023
340	4040403	CONEXIÓN DE RED ALCANTARILLADO EXISTENTE A POZO DE VISITA NUEVO, DE ACUERDO A	pza	1.00	08/Sep/2023	30c	07/Oct/2023



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 6

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina
		LO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 3 SEGÚN CONDICIONES DE LA OBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
		REPARACIONES Y REPOSICIONES					
360	1080122	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 4 50 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO	pza	12.00	13/Jul/2023	68c	18/Sep/2023
370	8060650	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR CON 50% DE PIEDRA RECUPERADA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MATERIAL INERTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COMPACTACIÓN DE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	525.13	30/Ago/2023	88c	25/Nov/2023
380	8060662	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR CON 75% DE PIEDRA RECUPERADA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MAYOR A 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	117.00	30/Ago/2023	88c	25/Nov/2023
		LIMPIEZA					
400	1020501	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	m2	642.13	05/Jul/2023	148c	29/Nov/2023




Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 7

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP FISE AD.011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

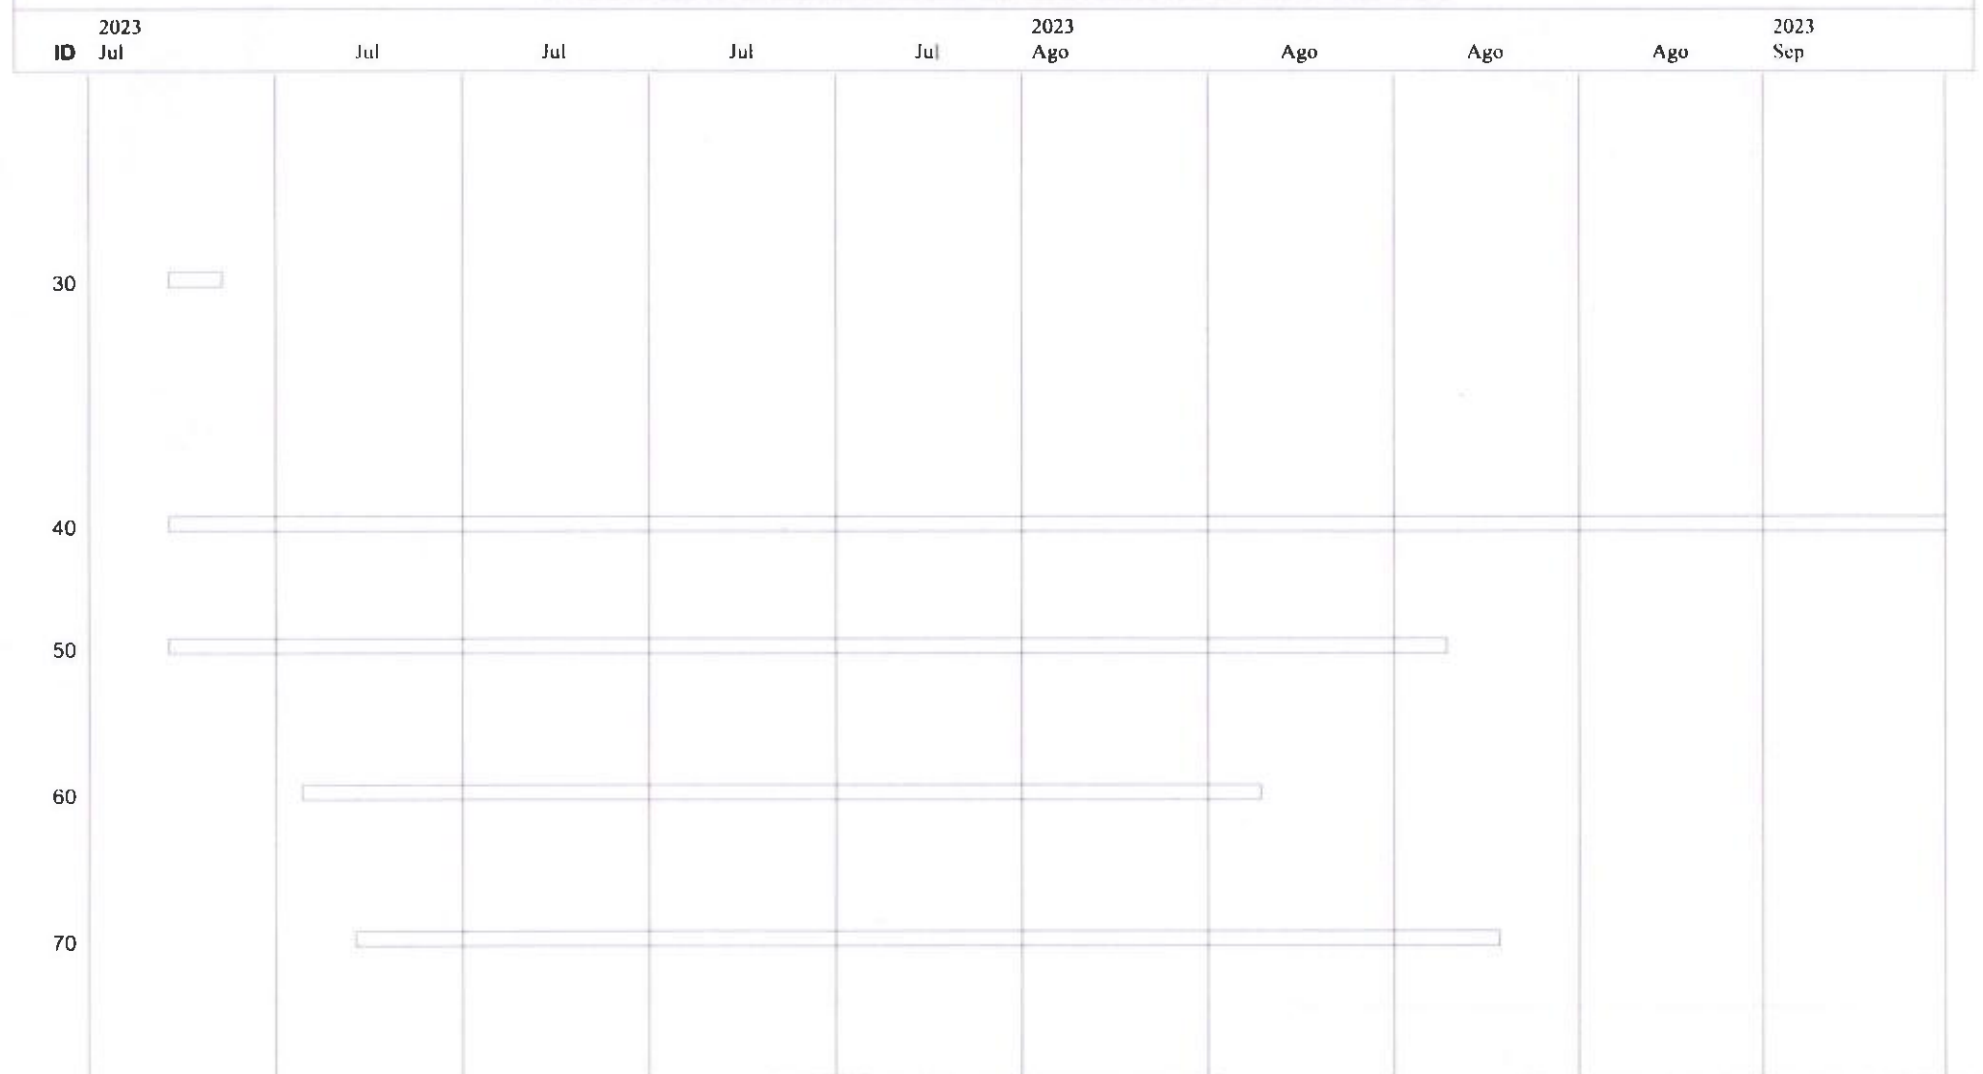



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 8

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD 011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023 Jul				2023 Ago				2023 Sep
	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	Sep
80	[Bar chart showing execution progress for ID 80]								
100	[Bar chart showing execution progress for ID 100]								
110	[Bar chart showing execution progress for ID 110]								
120	[Bar chart showing execution progress for ID 120]								
130	[Bar chart showing execution progress for ID 130]								
140	[Bar chart showing execution progress for ID 140]								
150	[Bar chart showing execution progress for ID 150]								



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 9

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023					2023				2023
	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	Sep
170										
180										
190										
210										
220										
230										
240										



BAIGUE
CONSTRUCTORA

Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 10

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023				2023				2023	
	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	Sep	Sep
260										
270										
280										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 11

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023					2023				2023
	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	Sep
290										
300										
310										
320										
330										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP FISE AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 12

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023 Jul				2023 Ago			2023 Sep	
	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Sep	
340									
360									
370									
380									
400									



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 13

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023					2023				2023
	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Ago	Ago	Ago	Ago	Sep
	1.07%	1.85%	4.71%	8.01%	8.48%	8.48%	8.43%	8.23%	8.87%	9.00%
	1.07%	2.92%	7.64%	15.65%	24.13%	32.61%	41.04%	49.27%	58.14%	67.14%



BRIGUE
CONSTRUCTORA

Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 14

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	2023		2023	2023		2023		2023	2023	
ID	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Nov	Nov
30										
40										
50										
60										
70										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 15

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023		2023		Oct	Oct	Oct	Oct	2023	
	Sep	Sep	Sep	Oct					Nov	Nov
80										
110										
130										
140										
150										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 16

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023			2023				2023	
	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Nov
170	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Sep 15]								
180	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Oct 10]								
190	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Oct 15]								
210	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Oct 10]								
220	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Sep 25]								
230	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Sep 10]								
240	[Bar chart showing activity from Sep 1 to Oct 5]								



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 17

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023		2023		Oct	Oct	Oct	Oct	2023	
	Sep	Sep	Sep	Oct					Nov	Nov
260										
270										
280										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 18

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023			2023				2023	
	Sep	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Nov
290									
300									
310									
320									
330									



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 19

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ID	2023		2023		2023		2023		2023	
	Sep	Sep	Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	Nov	Nov	
340										
360										
370										
380										
400										



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 20

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023 ID	Sep	Sep	Sep	2023 Oct	Oct	Oct	Oct	Oct	2023 Nov	Nov
	8.96%	7.47%	6.86%	4.23%	1.40%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%
	76.10%	83.57%	90.43%	94.66%	96.06%	96.72%	97.37%	98.03%	98.68%	99.34%



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 21

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
30	
40	
50	
60	
70	



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 22

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
80	
100	
110	
120	
130	
140	
150	



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.

OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD.011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 23

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
170	
180	
190	
210	
220	
230	
240	



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 24

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
260	
270	
280	



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP FISE AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 25

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

2023	
ID	Nov
290	
300	
310	
320	
330	




Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 26

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP.FISE.AD.011/2023-00419

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

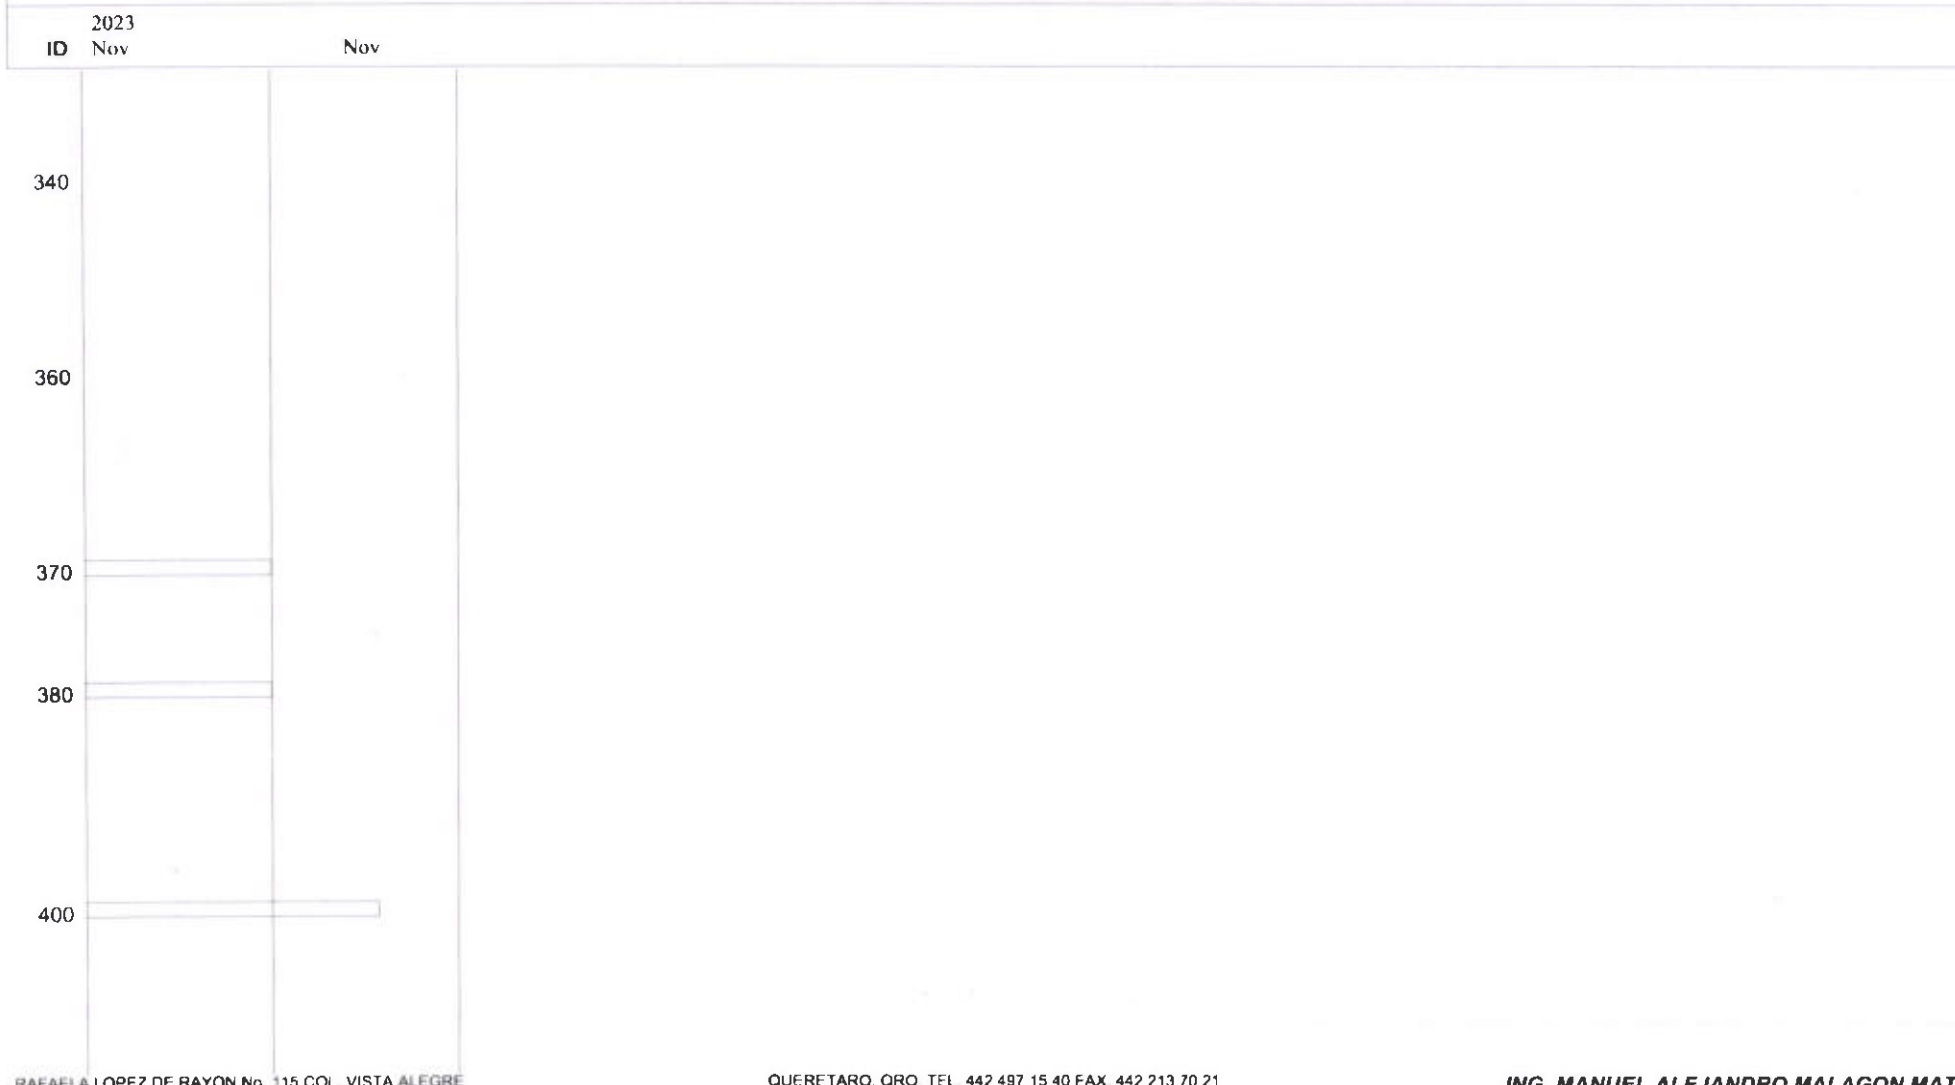



Ampliación de tiempo
del 02 al 29 de noviembre
plazo de ampliación: 28 días.

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
OBRA: REHABILIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO.
CONCURSO No. SOP FISE AD 011/2023-00419

FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATURALES
FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023
HOJA No. 27

PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


2023	
ID	Nov
	0.65%
	99.99%
	0.01%
	100.00%


Fecha 20 / Oct / 2023

Folio N° 20 / Anexo N° 1

Nota # 38

Mediante esta fecha se informa que se realiza recorrido de obra para definir los alcances de obra se menciona que debido a los trabajos no ejecutados de excavación en material C y otros ha sobrado un recurso económico que nos ayuda ha realizar una ampliación de meta) pero debido al tiempo se aproxima la fecha límite del contrato se solicita al contratista genere un oficio y una recalendario de los trabajos para poder realizar un dictamen técnico por una ampliación de tiempo en donde el contratista deberá solicitar la ampliación de tiempo no mayor al 25% del tiempo del contrato y así poder llegar al monto del contrato.


Arq. Luis Enrique Jimenez Almaraz
Supervisor de obra



Ing. Manuel Alejandro Malagon Mata
Residente de la obra

Nota # 39

23 / octubre / 2023

Se informa que se realizan trabajos de descargas sanitarias y elaboración de registros sanitarios. Se informa que la perforación de la obra no se encuentra por lo que se solicita al contratista volver a colocarla.

Arq. Luis Enrique Jimenez Almaraz
Supervisor de obra


Ing. Manuel Alejandro Malagon Mata
Residente de la obra

Elaborado por:

Recibido por:


BITÁCORA DE OBRA


Fecha 25 / Oct / 2023

Folio N° 21 / Anexo N° 1

Mediante esta fecha se informa que el contratista ingresa el oficio de ampliación de tiempo con sus anexos, dirigido a la dirección de obras públicas, por una ampliación de 28 días naturales.

Se informa que se realizó el dictamen técnico por la ampliación de tiempo para ampliar meta).


Arq. Luis Enrique Jimenez Almaraz
Supervisor de obra


Ing. Manuel Alejandro Malagon Mata
Residente de la obra

Elaborado por:

Recibido por:
